


PLAN MONTAŻU ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH PARTERU (MOUNTING PLAN PREFABRICATED WALLS OF THE GROUND FLOOR)
ELEMENTY PARTERU BUDYNKU (GROUND ELEMENTS BUILDINGS) 1:100

- NOTES:
- The thickness of the walls:
- External load-bearing construction:
a) 15 + 10 + 6 cm = 31cm
- Structural load-bearing interior: 20cm,
3. Precast be installed in accordance with the instructions technological manufacturer
 - Drawings considered together with the project architect. and industry.
 - The construction of a reinforced concrete carried out in accordance with design and standards
 - Punctures by Fig. Industry
 - The diameter of the rod, specified in [mm], spacing and length, in [cm]
 - Luz mounting castles 0,5cm-on connection walls (vertical fuge)
 - Rod starter castles Nr80 # 16 L = 350cm
 - Rod startup projects over the next floor ceiling, in order to anchor the walls higher stories
 - If the rod does not protrude starter before mounting each wall należy site connections drill a hole and paste rod starting NR11 # 16 L = 100cm
 - Walls put on pads leveling and mortar approx. 2cm
 - Styrofoam sandwich thickness in the walls. About 10cm et al. Lambda 0.032 graphite additive
 - Slab thickness: 24cm
 - Robusta pipe of the preforms after their planting pour grout np. Ceresit CX15 or an equivalent


- UWAGI:
- Grubość ścian:
- konstrukcyjnych nośnych zewnętrznych:
a) 15+10+6cm = 31cm
- konstrukcyjnych nośnych wewnętrznych: 20cm,
3. Prefabrykaty należy montować zgodnie z instrukcją technologiczną producenta,
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami architekt. i branżowymi.
 - Konstrukcję żelbetonową wykonać zgodnie z PN-B-03264:2002, PN-B-03263:2000.
 - Przebiecia wg. rys. branżowych
 - Średnicę pr. podano w [mm], rozstawy i dł. w [cm].
 - Luz montażowy na zamkach 0,5cm-przy połączeniu ścian (fuga pionowa)
 - Pręt startowy do zamków Nr80 #16 L=350cm
 - Pręt startowy wystaje nad strop następnej kondygnacji, w celu kotwienia ścian wyższych kondygnacji
 - W przypadku kiedy nie wystaje pręt startowy, przed montażem każdej ściany należy w miejscu połączeń wywiercić otwór i wkleić pręt startowy Nr11 #16 L=100cm
 - Ściany stawiać na podkładkach niwelacyjnych i zaprawie ok. 2cm
 - Styropian w ścianach warstwowych gr. 10cm o wsp. lambda 0,032 z dodatkiem grafitu
 - Grubość stropu: 24cm
 - Rury robusta w prefabrykatkach po ich osadzeniu zaalać zaprawą np. Ceresit CX15 lub inną równoważną

BETON (CONCRETE): STAL (SEEL): # - A-IIIN (RB500W), B30 (C25/C30), Ø- A-I (St3SY-b),

otulina zbr. (concrete cover): 2,5cm

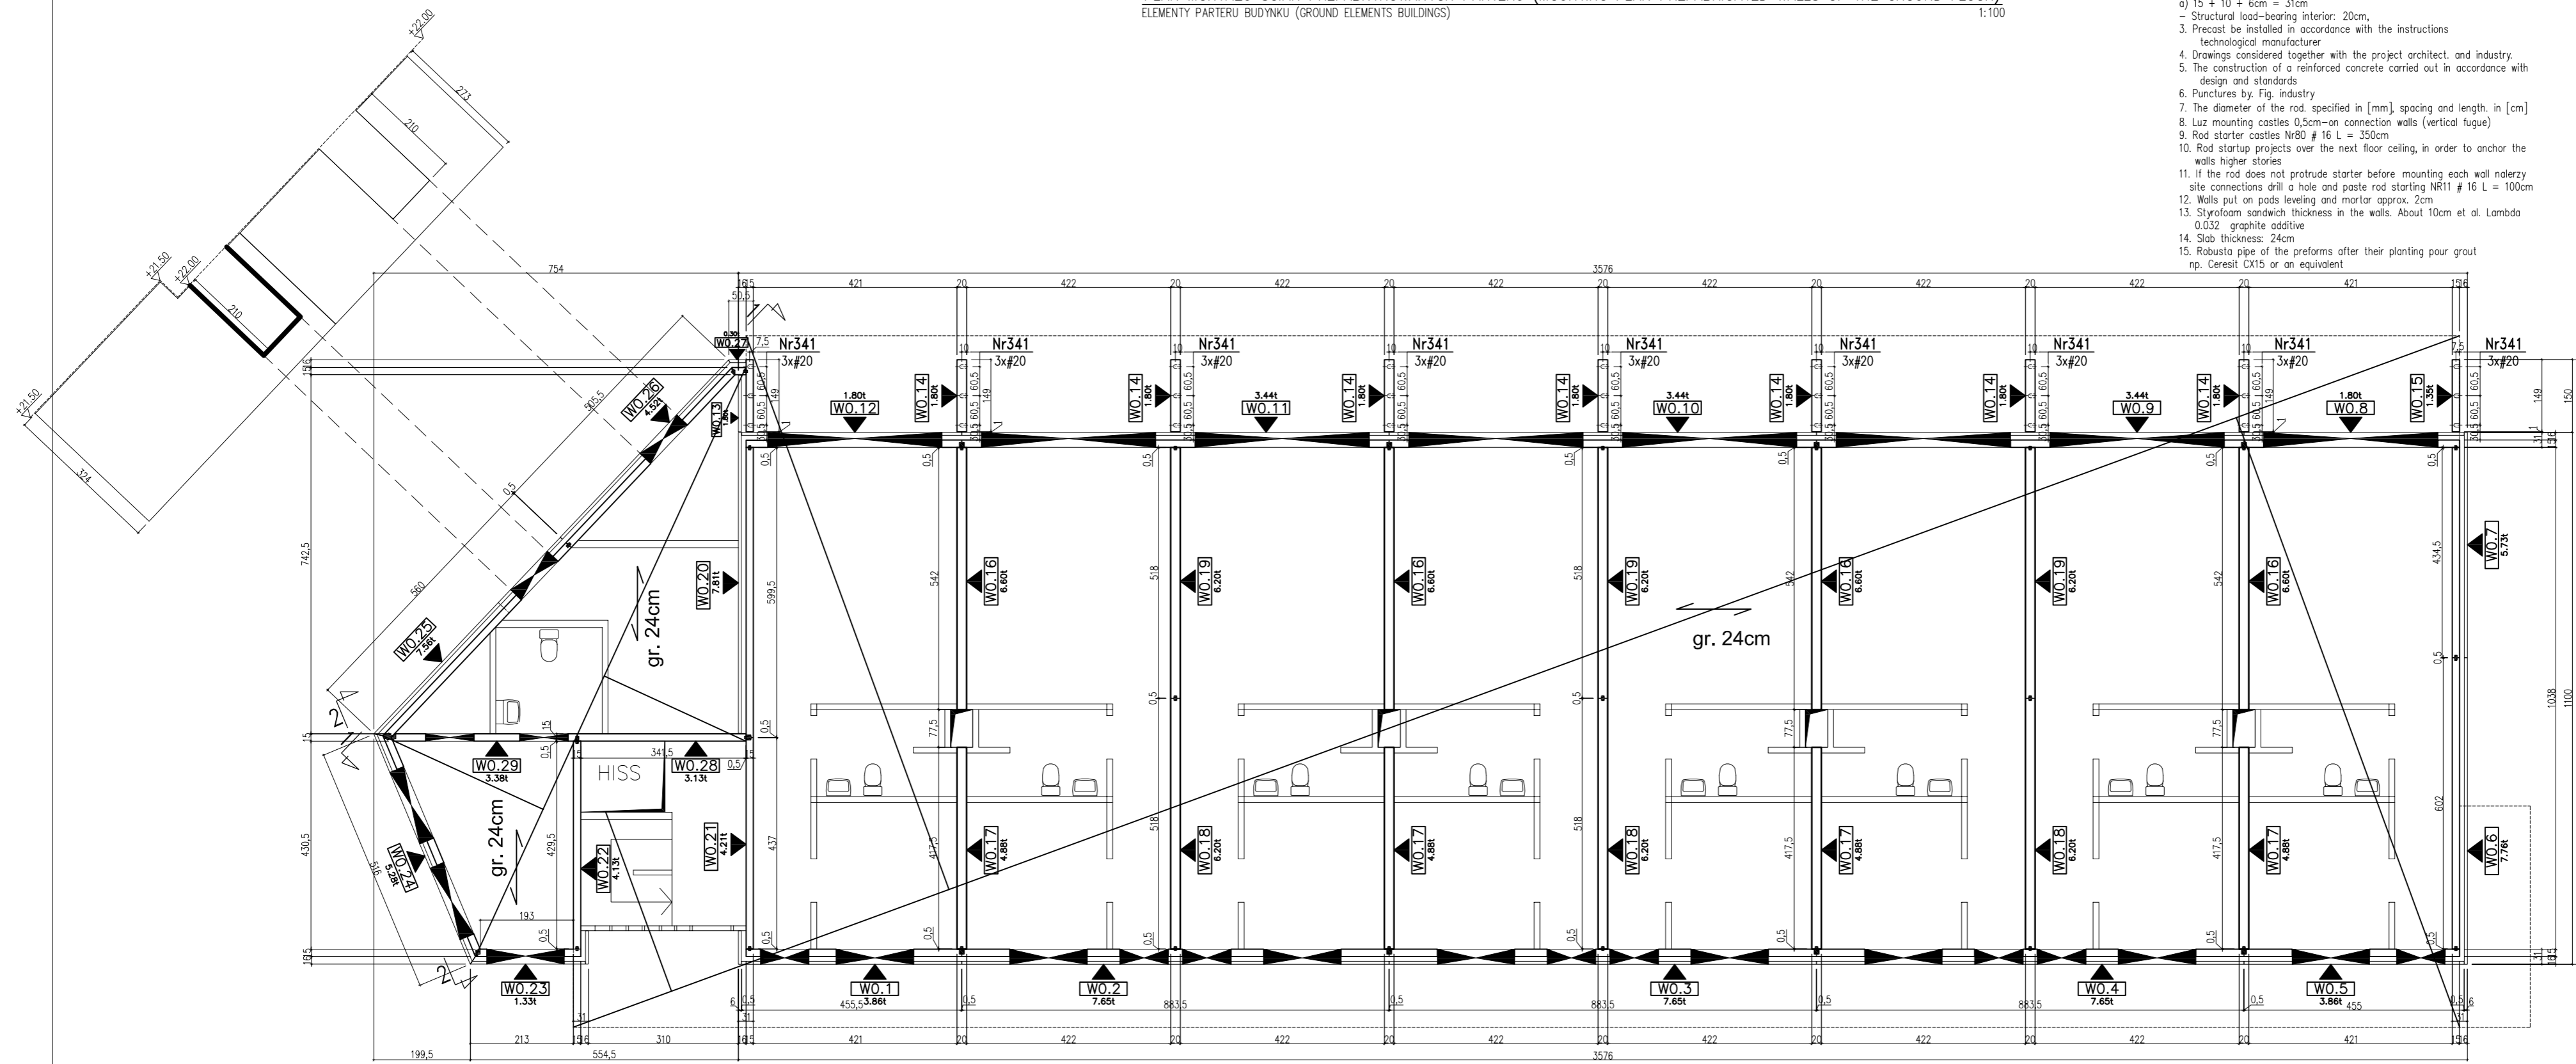

ELEWACJA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH PARTERU (ELEVATION PLAN PREFABRICATED WALLS OF THE GROUND FLOOR) 2-2
ELEMENTY PARTERU (ELEMENTS OF GROUND FLOOR) 1:100

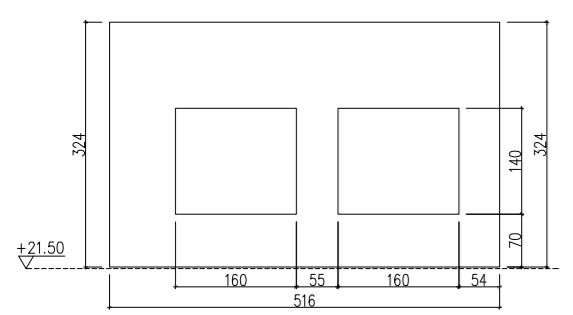

GROUND FLOOR


350
30#16-80 L=350

100
30#16-11 L=100

100
27#20-341 L=100

7#8-87 L=30

Zestawienie na Imb otworu
Pręt umieszczać po obwodzie otworowania
Statement on Imb hole
Rod place the circumference of the opening

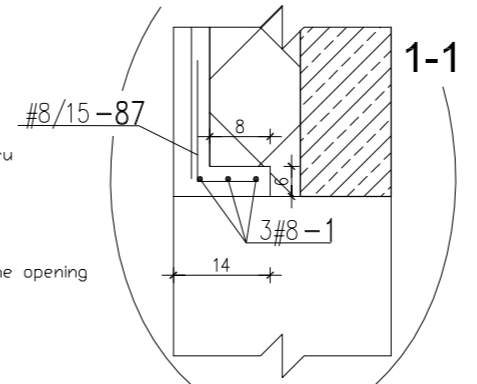

- LEGENDA (legend):
- D - GRUBOŚĆ (thickness)
 - W - WIERZCH (top)
 - S - SPÓD (bottom)
 - OTS - OTWÓR W STROPIE (opening in the roof)
 - HZ - WYSOKOŚĆ ZMIENNA (variable height)
 - D.K. - DOLNA KRAWĘDZ (bottom edge)
 - G.K. - GÓRNA KRAWĘDZ (top edge)
 - OTWÓR W ŚCIANIE-OTW (opening in the wall)
 - stłupy pod stropem (locks the ceiling)
 - ściany prefabrykowane nośne (prefabricated walls)
 - warstwa elewacyjna 6cm (cladding layer 6cm)

- LEGENDA (legend):
- KIERUNEK PATRZENIA NA PREFABRYKAT (way of looking at the prefabricated wall)
 - Wx.y - numer prefabrykatu (prefabricated number):
W-nośne (carrying), D-działowe (partition),
x-nr kondygnacji: 0-partier (ground floor),
1-I piętro (first floor),
2-II piętro (second floor),
3-III piętro (third floor),
y-nr kolejny prefabrykatu
 - 2.15t - ciężar elementu (the weight of the item)
 - wierzch płyty stanu surowego (raw state top plate)
 - spód płyty stanu surowego (raw state bottom plate)

Revision 2	ZMIANA ŚCIANY WO.26/CHANGE WALL WO.26
Revision 1	ZMIANA ŚCIAN/CHANGE WALL WO.23-WO.24-WO.25-WO.26-WO.27-WO.29

INWESTOR
Investor
PARTNER ENTREPRENAD I SVERIGE AB
Ryttarevagen 10
302 62 HALMSTAD
SE 556402475901

TYTUŁ PROJEKTU
Project Title
TYLÖSAND 2:150, HALMSTADS KOMMUN
TYLÖSAND, HALMSTAD
NYBYGGNAD AV LÄGENHETSHOTELL

ZAMIAŁ PREFABRYKACJI

BIURO PROJEKTÓW (Office projects)
Tomasz Gromala
Chojnow, ul. Paderewskiego 16c/10
tel. 0 692 465 960
tomdom@tomdom.net tomdom_tg@wp.pl

PROJEKTOWAŁ (Designed)
mgr inż. Czarek Ciesielski
inż. Bohdan Jablorski 409/73/Kt
mgr inż. Tomasz Gromala

IMIĘ I NAZWISKO Names	NR UPRAWNIEN Licence Number	PODPIS Signature
--------------------------	--------------------------------	---------------------

FAZA
Purpose
PROJEKT WYKONAWCZY (executive project)

BRANŻA
Trade
KONSTRUKCJE (construction)

TREŚĆ RYSUNKU (Content of the drawing)
SCHEMAT MONTAŻU ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH PARTERU - ściany,
CHART INSTALLATION GROUND FLOOR prefabricated elements - Walls,

DATA
Date
12.2015

SKALA
Scale
1:100

BUDYNEK
Purpose
FAZA
Purpose
NUMER RYSUNKU
DRAWING NO.
REWIZJA
Revision

Hotel P.W. K-1.0 2
