


PLAN MONTAŻU ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH I PIĘTRA (MOUNTING PLAN PREFABRICATED WALLS OF THE FIRST FLOOR)
ELEMENTY I PIĘTRA BUDYNKU (FIRST FLOOR ELEMENTS BUILDINGS) 1:100

- NOTES:
- The thickness of the walls:
- External load-bearing construction:
a) 15 + 10 + 6cm = 31cm
- Structural load-bearing interior: 20cm,
3. Precast be installed in accordance with the instructions technological manufacturer
 - Drawings considered together with the project architect. and industry.
 - The construction of a reinforced concrete carried out in accordance with design and standards
 - Punctures by Fig. Industry
 - The diameter of the rod, specified in [mm], spacing and length, in [cm]
 - Luz mounting castles 0,5cm-on connection walls (vertical fugue)
 - Rod starter castles Nr80 # 16 L = 350cm
 - Rod startup projects over the next floor ceiling, in order to anchor the walls higher stories
 - If the rod does not protrude starter before mounting each wall należy site connections drill a hole and paste rod starting NR11 # 16 L = 100cm
 - Walls put on pads leveling and mortar approx. 2cm
 - Styrofoam sandwich thickness in the walls. About 10cm et al. Lambda 0.032 graphite additive
 - Slab thickness: 24cm
 - Robusta pipe of the preforms after their planting pour grout np. Ceresit CX15 or an equivalent

- UWAGI:
- Grubość ścian:
- konstrukcyjnych nośnych zewnętrznych:
a) 15+10+6cm = 31cm
- konstrukcyjnych nośnych wewnętrznych: 20cm,
3. Prefabrykaty należy montować zgodnie z instrukcją technologiczną producenta,
 - Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami architekt. i branżowymi.
 - Konstrukcję żelbetonową wykonać zgodnie z PN-B-03264:2002, PN-B-03263:2000.
 - Przebiecia wg. rys. branżowych
 - Konstrukcję żelbetonową wykonać zgodnie z PN-B-03264:2002, PN-B-03263:2000.
 - Przebiecia wg. rys. branżowych
 - Średnicę pr. podano w [mm], rozstawy i dł. w [cm].
 - Luz montażowy na zamkach 0,5cm-przy połączeniu ścian (fuga pionowa)
 - Pręt startowy do zamków Nr80 #16 L=350cm
 - Pręt startowy wystaje nad strop następnej kondygnacji, w celu kotwienia ścian wyższych kondygnacji
 - W przypadku kiedy nie wystaje pręt startowy, przed montażem każdej ściany należy w miejscu połączeń wywiercić otwór i wkleić pręt startowy Nr11 #16 L=100cm
 - Ściany stawić na podkładkach niwelacyjnych i zaprawie ok. 2cm
 - Styrofoam w ścianach warstwowych gr. 10cm o wsp. lambda 0,032 z dodatkiem grafitu
 - Grubość stropu: 24cm
 - Rury robusta w prefabrykatkach po ich osadzeniu założyć zaprawą np. Ceresit CX15 lub inną równoważną


BETON (CONCRETE): B30 (C25/C30),
STAL (SEEL): # - A-IIIN (RB500W), Ø- A-I (S13SY-b),
otulina zbr. (concrete cover): 2,5cm

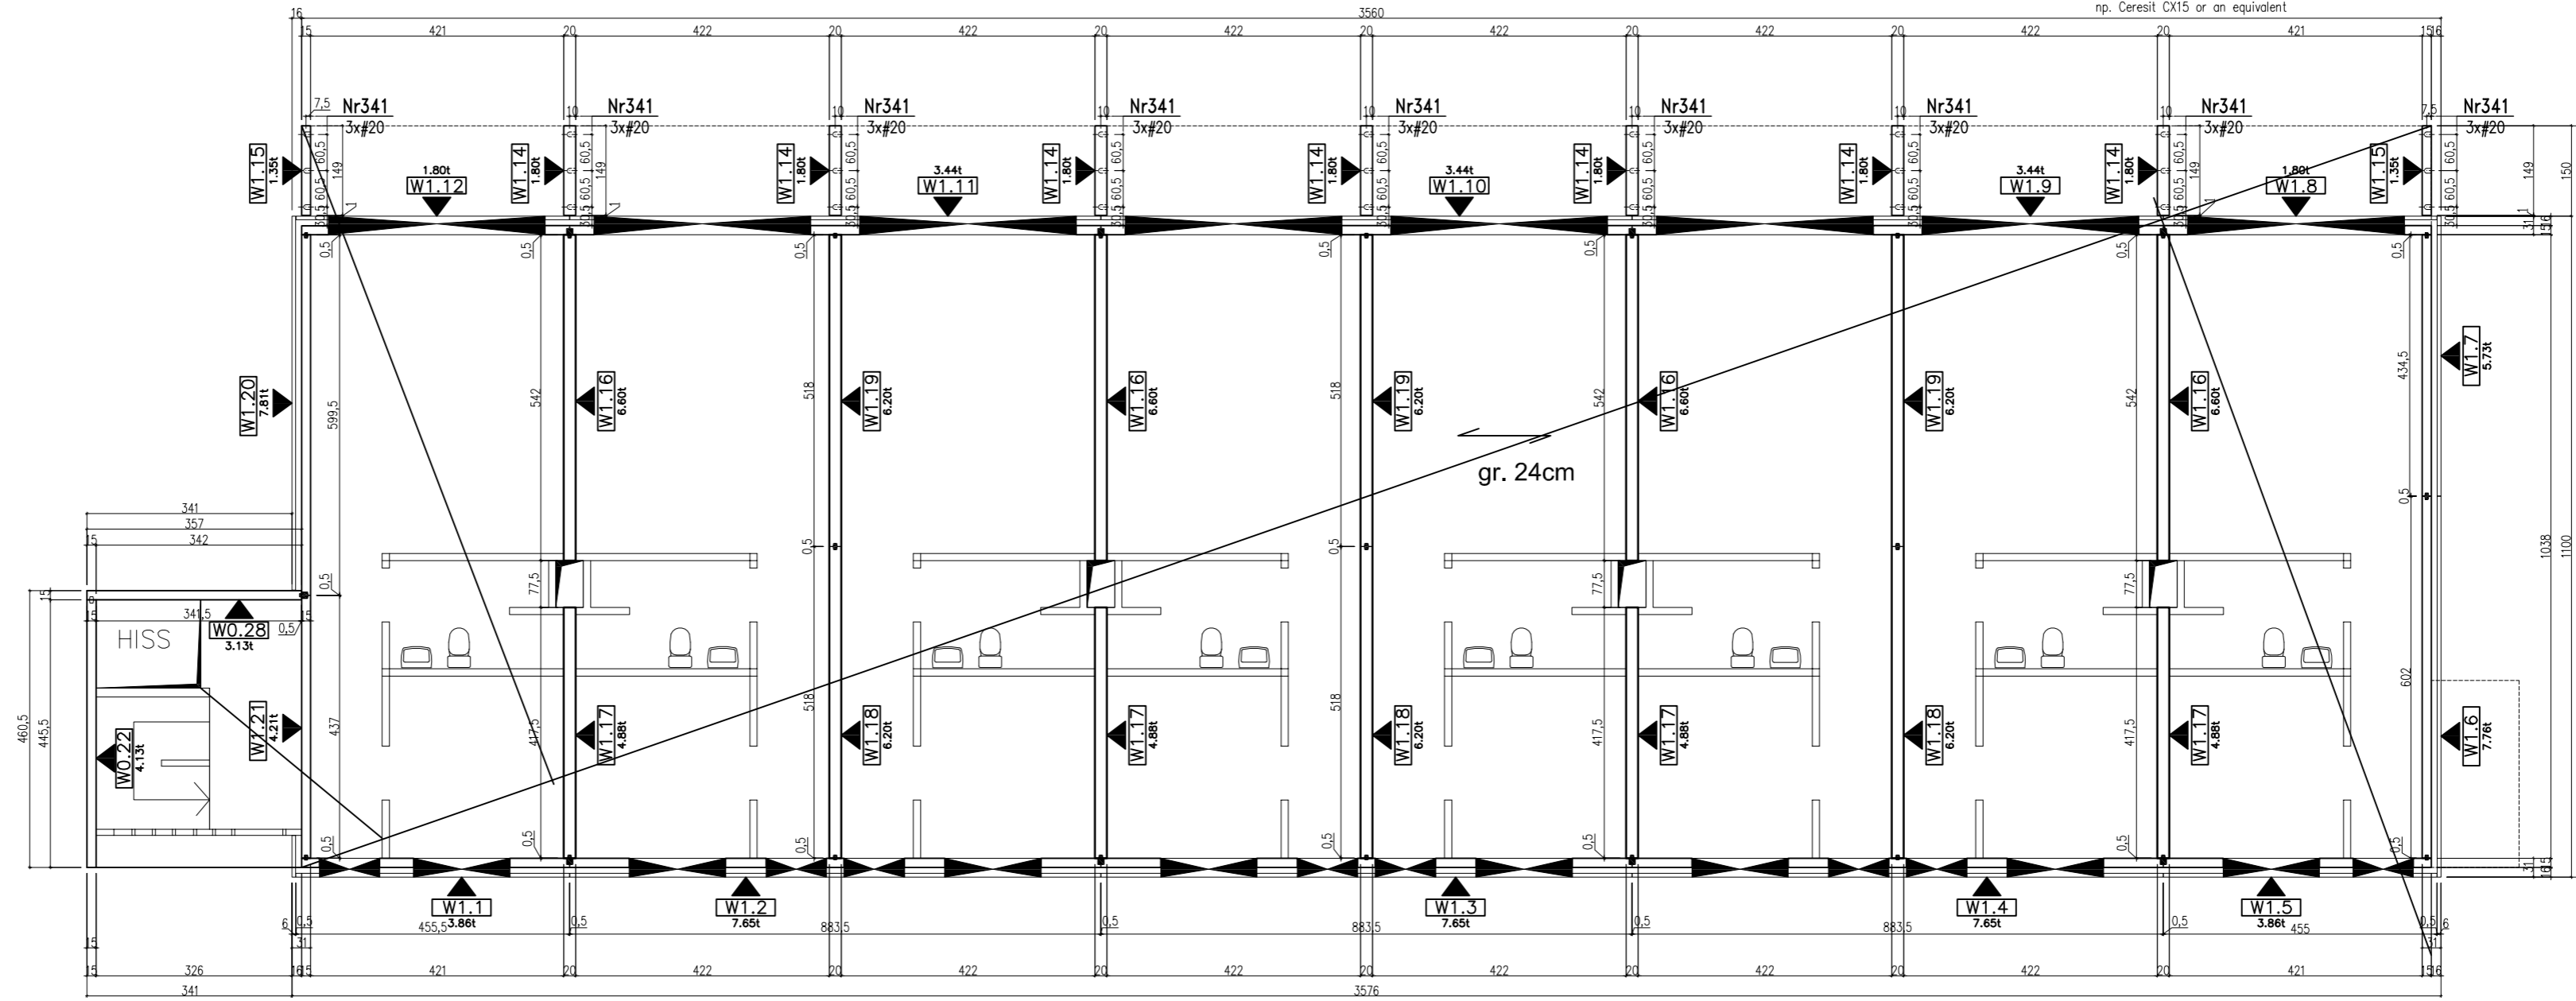

FIRST FLOOR

350
30#16-80 L=350
100
30#16-11 L=100
100
27#20-341 L=100
7#8-87 L=30

Zestawienie na Imb otworu
Pręt umieszczać
po obwodzie otworowania
Statement on Imb hole
Rod place
the circumference of the opening

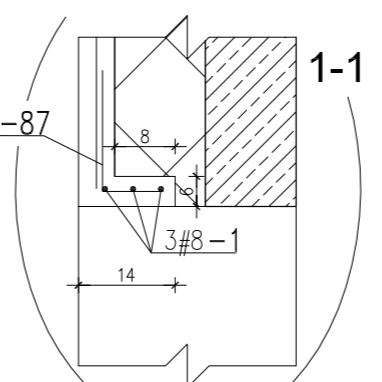

- LEGENDA (legend):
- D - GRUBOŚĆ (thickness)
 - W - WIERZCH (top)
 - S - SPÓD (bottom)
 - OTS - OTWÓR W STROPIE (opening in the roof)
 - HZ - WYSOKOŚĆ ZMIENNA (variable height)
 - D.K. - DOLNA KRAWĘDZ (bottom edge)
 - G.K. - GÓRNA KRAWĘDZ (top edge)
 - OTWÓR W ŚCIANIE-OTW (opening in the wall)
 - stłupy pod stropem (locks the ceiling)
 - ściany prefabrykowane nośne (prefabricated walls)
 - warstwa elewacyjna 6cm (cladding layer 6cm)

- LEGENDA (legend):
- KIERUNEK PATRZENIA NA PREFABRYKAT (way of looking at the prefabricated wall)
 - Wx.y - numer prefabrykatu (prefabricated number):
W-nośne (carrying), D-działowe (partition),
x-nr kondygnacji: 0-parter (ground floor),
1-I piętro (first floor),
2-II piętro (second floor),
3-III piętro (third floor),
y-nr kolejny prefabrykatu
 - 2.15t - ciężar elementu (the weight of the item)
 - wierzch płyty stanu surowego (raw state top plate)
 - spód płyty stanu surowego (raw state bottom plate)

Revisjon		
Revisjon		
INWESTOR Investor	PARTNER ENTREPRENAD I SVERIGE AB Ryttarevagen 10 302 62 HALMSTAD SE 556402475901	
TYTUŁ PROJEKTU Project Title	TYLÖSAND 2:150, HALMSTADS KOMMUN TYLÖSAND, HALMSTAD NYBYGGNAD AV LÄGENHETSHOTELL	
ZAMAW. PREFABRYKACJI		
BIURO PROJEKTÓW (Office projects)	Tomasz Gromala Chojnow, ul. Paderewskiego 16c/10 tel. 0 692 465 960 tomdom@tomdom.net tomdom_tg@wp.pl	
PROJEKTOW. (Design)	mgr inż. Czarek Ciesielski inż. Bohdan Jablorski 409/73/Kt mgr inż. Tomasz Gromala	
IMIĘ I NAZWISKO Names	NR UPRAWNIEN Licence Number	PODPIS Signature
FAZA Purpose	PROJEKT WYKONAWCZY (executive project)	
BRANŻA Trade	KONSTRUKCJE (construction)	
TREŚĆ RYSUNKU (Content of the drawing)	SCHEMAT MONTAŻU ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH I PIĘTRA ściany, CHART INSTALLATION FIRST FLOOR prefabricated elements - Walls,	
DATA Date	12.2015	SKALA Scale 1:100
BUDYNEK	FAZA Purpose	NUMER RYSUNKU DRAWING NO.
		REWIZJA Revision
Hotel P.W. K-2.00		
